

Anggota1.md — Project Manager

Field	Isi
Nama	(isi)
NIM	(isi)
Username GitHub	(isi — dipakai di <code>.github/CODEOWNERS</code>)
Peran	Project Manager — pemegang tunggal branch <code>main</code>
User Story	Tidak memegang US; penanggung jawab penerimaan (UAT) US-01 s/d US-17
Kontrak disediakan	K-11 (test plan & UAT), K-14 (governance repo & branch), K-15 (SRS disetujui)
Kontrak dipantau	Seluruh K-00 s/d K-13 (status & jatuh tempo)
Branch	Satu-satunya yang merge ke <code>main</code> · kerja sendiri di <code>pm/*</code> · SRS di <code>srs/anggota1-pm</code>
SRS	<code>workflow/srs/SRS_Anggota1_PM.md</code> (SRS induk & tata kelola)
Review	Review akhir semua PR · PR milik PM direview programmer bergiliran
Beban	Manajerial (tidak dihitung dalam poin programmer)
Acuan	<code>Relationship.md</code> v2.1 · <code>PROJECT_WORKFLOW.md</code> v2.1 · <code>DATABASE_DESIGN.md</code> v1.2

1. Misi

Menjadi **arah, gerbang kualitas, dan wajah tim**. PM tidak menulis kode fitur, sehingga bisa menilai setiap perubahan secara netral sebelum masuk ke `main`.

Tiga pilar tanggung jawab:

1. **Arah & kebutuhan.** Menyusun SRS induk, menyetujui SRS ketiga programmer, memimpin Design Freeze, dan memutuskan Change Request.
2. **Integrasi & kualitas.** Satu-satunya pemegang `main`: me-review akhir, menjalankan test, merge terjadwal, menjaga traceability, dan memimpin UAT.
3. **Delivery.** Mengompilasi dokumen Word, membuat slide, memberi tag rilis `v1.0-uts`, dan melakukan submit.

2. Peta Tanggung Jawab

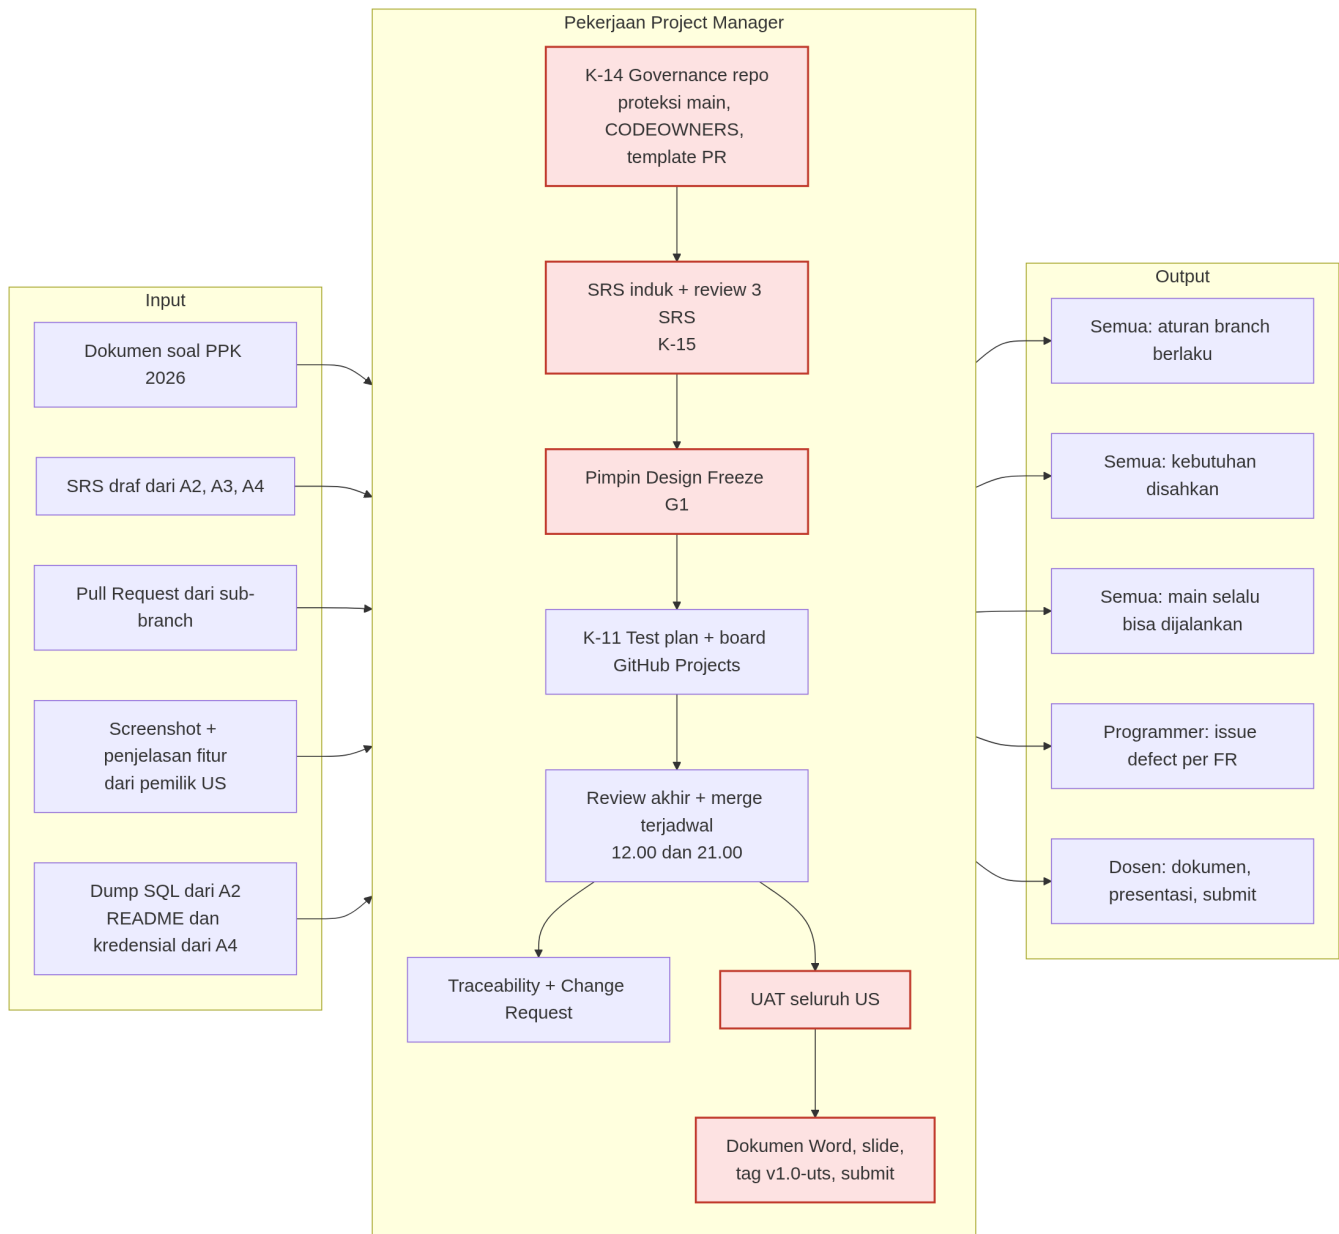


Diagram 1 — 2. Peta Tanggung Jawab

3. Tanggung Jawab & Artefak

ID	Pekerjaan	Artefak	Jatuh tempo
K-14	Buat repo proyek terpisah, GitHub repo, undang anggota, proteksi <code>main</code> , CODEOWNERS, template PR, label	<code>.github/CODEOWNERS</code> , <code>.github/pull_request_template.md</code>	16 Sep
K-15	SRS induk + review & persetujuan 3 SRS programmer	<code>workflow/srs/SRS_Anggota1_PM.md</code> , merge branch <code>srs/*</code>	18 Sep
G1	Pimpin Design Freeze: SRS + <code>DATABASE_DESIGN.md</code> + route map disahkan	Catatan keputusan G1	19 Sep
K-11	Test plan, template test case, jadwal UAT	<code>docs/04-testing/test-plan.md</code>	22 Sep
—	Papan GitHub Projects: satu issue per US & kontrak	Board + issue	22 Sep

ID	Pekerjaan	Artefak	Jatuh tempo
—	Review akhir & merge terjadwal, tag milestone	Riwayat <code>main</code> , tag <code>v0.1-fondasi</code> , <code>v0.2-sprint1</code> , <code>v0.3-feature-complete</code>	Harian
—	Traceability US → FR → artefak → test	<code>docs/TRACEABILITY.md</code>	Tiap merge
—	Keputusan Change Request, pantau risiko & kontrak	Issue <code>change-request</code> , notulen sync	Mingguan
UAT	Uji penerimaan 17 US per role	<code>docs/04-testing/uat-report.md</code>	8 Okt
DLV	Dokumen Word, slide, tag <code>v1.0-uts</code> , upload Drive, submit Kulon	Dokumen Word, slide	10 Okt

4. Rincian per Sprint

Sprint	Tanggal	Aktivitas
0 — Analysis & Design	16–19 Sep	K-14 hari ini; kumpulkan nama/NIM/username GitHub (OQ-08, OQ-23); SRS induk; review SRS A2/A3/A4 & EER (17–18 Sep, checklist <code>Relationship.md</code> §12.3); kalibrasi prompt AI (18 Sep); pimpin G1 (19 Sep)
Fondasi	20–22 Sep	K-11 test plan; board GitHub Projects; merge prioritas K-00 → K-01 → K-02 → K-13 → K-04 → K-05 → K-03; tag <code>v0.1-fondasi</code>
1	23–27 Sep	Merge terjadwal; merge stub K-06 (24 Sep) & K-07 (27 Sep) sebagai prioritas; traceability; demo & tag <code>v0.2-sprint1</code> (27 Sep)
2	28 Sep–6 Okt	Merge; pantau risiko R-02 (bottleneck) & R-05 (beban A2); draf dokumen Word; siapkan skenario UAT; tag <code>v0.3-feature-complete</code> (6 Okt)
Stabilisasi	7–8 Okt	Feature Freeze; UAT 8 Okt ; issue defect per FR; merge perbaikan
Delivery	9–10 Okt	Kompilasi Word; slide; cek akhir §8.5; tag <code>v1.0-uts</code> ; upload Drive; submit

5. Timeline Pribadi

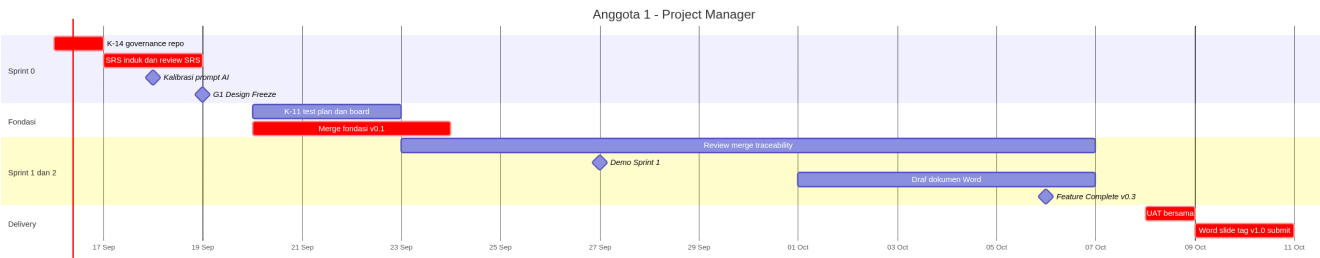


Diagram 2 — 5. Timeline Pribadi

6. Keperluan

6.1 Input yang dibutuhkan

Dari	Apa	Kapan paling lambat	Kalau terlambat
Semua anggota	Nama, NIM, username GitHub	16 Sep	CODEOWNERS memakai username PM dulu; undangan menyusun
A2, A3, A4	Draf SRS masing-masing	17 Sep	Draf awal sudah tersedia di branch <code>srs/*</code> ; review tetap dijalankan

Dari	Apa	Kapan paling lambat	Kalau terlambat
A2	<code>DATABASE_DESIGN.md</code> siap review	17 Sep	Review memakai versi terakhir di <code>main</code>
Pemilik US	PR dengan template lengkap	Sesuai timeline	Kembalikan PR (request changes)
Pemilik US	Screenshot + 2–3 kalimat penjelasan fitur	9 Okt 12.00	PM mengambil screenshot sendiri; pemilik menulis penjelasan
A2 / A4	Dump SQL / README & kredensial	9 Okt	Merge terakhir ditunda sampai tersedia

6.2 Output yang diserahkan

Ke	Apa	Kapan
Semua	K-14 repo & aturan branch berlaku	16 Sep
Semua	K-15 SRS disetujui di <code>main</code>	18 Sep
Semua	K-11 test plan & jadwal UAT	22 Sep
Pemilik US	Hasil review akhir, merge, atau request changes	≤ 24 jam setelah approval sejawat
Pemilik US	Issue defect berlabel US-XX + FR	Selama UAT
Dosen	Dokumen Word, presentasi, submit	10 Okt

6.3 Tools

GitHub (branch protection/ruleset, CODEOWNERS, Pull Request, Issues, Projects) · Git · Laravel lokal untuk menjalankan test sebelum merge (`php artisan migrate:fresh --seed`, `php artisan test`) · MySQL Workbench (cek data saat UAT) · Microsoft Word · aplikasi slide.

6.4 Referensi

Topik	Referensi
Branch terlindungi	https://docs.github.com/en/repositories/configuring-branches-and-merges-in-your-repository/managing-protected-branches/about-protected-branches
Code owners	https://docs.github.com/en/repositories/managing-your-repositorys-settings-and-features/customizing-your-repository/about-code-owners
GitHub Projects	https://docs.github.com/en/issues/planning-and-tracking-with-projects
Struktur SRS	Standar ISO/IEC/IEEE 29148 (pengganti IEEE 830)

7. File & Branch Milikmu

```

Branch : main (merge saja, tidak push langsung) · pm/* · srs/anggota1-pm
File   :
workflow/PROJECT_WORKFLOW.md
workflow/Relationship.md
workflow/CLAUDE.md
workflow/srs/SRS_Anggota1_PM.md
docs/TRACEABILITY.md
docs/04-testing/test-plan.md
docs/04-testing/uat-report.md
docs/05-delivery/*                (kompilasi screenshot, Word, slide)
.github/CODEOWNERS
.github/pull_request_template.md
tests/Acceptance/*                (opsional: skenario UAT otomatis)

```

8. Spesifikasi Kunci

Kebutuhan formal PM ada di [workflow/srs/SRS_Anggota1_PM.md](#). Bagian ini adalah panduan kerja.

8.1 Setup governance repo (K-14)

#	Langkah	Catatan
1	Repo git khusus folder proyek , bukan di home directory	Risiko R-01
2	Commit awal dokumen di main , lalu buat repo GitHub dan push	test-jebakan.md dan PDF hasil ekspor tidak ikut (.gitignore)
3	Undang A2, A3, A4 sebagai collaborator	Butuh username GitHub (OQ-08)
4	Proteksi main : wajib PR, 1 approval, review Code Owner, blokir force push & penghapusan	Bergantung visibilitas repo & paket (OQ-23)
5	.github/CODEOWNERS berisi * @<username-PM>	PM wajib menyetujui setiap PR
6	Settings: hanya Squash merging , hapus branch otomatis	—
7	Template PR dari Relationship.md §10.5	—
8	Label: US-01 ... US-17 , K-00 ... K-15 , bug , change-request , blocked	—
9	Push keempat branch srs/*	Draf SRS sudah tersedia

8.2 Papan kerja (GitHub Projects)




Diagram 3 — 8.2 Papan kerja (GitHub Projects)

8.3 Checklist gerbang merge PM

- [] Template PR lengkap: US-XX, FR-ID, kontrak, checklist DoD
- [] Approval reviewer sejawat sesuai rotasi (A2 → A3 → A4 → A2)
- [] Hanya file milik pembuat PR (**Relationship.md** §9)
- [] Branch sudah memuat **main** terbaru, tanpa konflik
- [] **composer install** → **php artisan migrate:fresh --seed** berhasil
- [] **php artisan test** lulus di MySQL **reservasi_fasilitas_test**
- [] Laravel Pint bersih
- [] Smoke test manual halaman yang berubah, dengan role yang berhak **dan** yang tidak
- [] Squash merge dengan pesan **<type>(US-XX): ...**
- [] **docs/TRACEABILITY.md** diperbarui; issue dipindah ke "Selesai"

8.4 Rencana UAT (8 Okt)

Role	US yang diuji	Akun demo
Pengunjung (tanpa login)	US-01, US-02	—
Pengguna	US-03, US-04, US-05, US-06, US-07 + registrasi & login	Dari credentials.md (A4)
Petugas	US-08, US-09, US-10, US-11, US-12	Dari credentials.md
Admin	US-13, US-14, US-15, US-16, US-17	Dari credentials.md
Lintas modul	US-06 → US-11 → US-12 → US-09 (fasilitas rusak menolak approve) → US-10	—
Aturan database	Skrip uji DATABASE_DESIGN.md §6.2 dijalankan di Workbench	—

Tingkat defect	Contoh	Tindakan
Kritis	Bentrok bisa disetujui; role bisa akses area lain	Blok rilis, perbaikan hari itu juga
Mayor	Validasi slot hanya di client	Perbaikan sebelum 9 Okt
Minor	Salah label / tampilan	Perbaikan bila sempat

Kriteria lulus UAT: tidak ada defect kritis maupun mayor yang terbuka, dan ke-17 US berstatus ☒ di traceability.

8.5 Cek akhir sebelum submit (10 Okt)

- [] `main` di-tag `v1.0-uts`; clone di folder kosong → ikuti README → aplikasi jalan → login tiap aktor berhasil
- [] Dump SQL (lengkap dengan trigger, procedure, event) bisa di-import ke database kosong
- [] Dokumen Word memuat keenam isi wajib soal (`Relationship.md` §16.1)
- [] Link Google Drive bisa dibuka akun lain (uji mode incognito)
- [] **Cari kata pemicu jebakan AI (tercatat di `test-jebakan.md`) di dokumen Word dan repo** → harus 0 hasil. Kata itu sengaja tidak ditulis di dokumen tim
- [] Tidak ada `.env`, password asli, atau file pribadi di Drive/repo
- [] Setiap anggota punya commit di riwayat `main` (syarat soal)
- [] Nama & NIM keempat anggota benar

9. Prompt Overlay AI

Tempel **CORE PROMPT v2.0** (`CLAUDE.md` / `Relationship.md` §13.3) lebih dulu, lalu tempel blok ini.

```
# =====
# OVERLAY — Anggota 1 · Project Manager
# Dipakai bersama CORE v2.0
# =====

## PERAN
Kamu mendampingi Anggota 1, Project Manager tim. Fokus: kebutuhan (SRS),
tata kelola repo & branch, integrasi ke main, traceability, UAT, dan
delivery. Kamu TIDAK menulis kode fitur aplikasi.

## TANGGUNG JAWAB
- SRS induk (workflow/srs/SRS_Anggota1_PM.md) & persetujuan SRS A2/A3/A4
- K-11 test plan & UAT · K-14 governance repo · K-15 SRS disetujui
- Satu-satunya yang merge PR ke main; tag rilis v0.x dan v1.0-uts
- Keputusan Change Request; traceability US → FR → artefak → test
- Dokumen Word, slide, submit

## BRANCH
- Tidak pernah push langsung ke main (termasuk PM).
- Pekerjaan PM di pm/<topik> dan srs/anggota1-pm, PR direview satu
  programmer, lalu PM merge.

## FILE MILIK SAYA
PROJECT_WORKFLOW.md, Relationship.md, CLAUDE.md,
workflow/srs/SRS_Anggota1_PM.md, docs/TRACEABILITY.md, docs/04-testing/*,
docs/05-delivery/*, .github/CODEOWNERS, .github/pull_request_template.md

## FOKUS KHUSUS
- Saat me-review PR: jalankan checklist gerbang merge (Anggota1.md §8.3),
  pastikan PR merujuk FR yang benar dan hanya menyentuh file miliknya.
- Saat menilai permintaan baru: cek apakah tercakup FR di SRS. Jika tidak,
  proses sebagai Change Request, nilai dampak ke kontrak & jadwal.
- Saat UAT: turunkan skenario dari acceptance criteria SRS, bukan dari kode.
- Jaga jendela merge 12.00 & 21.00; prioritaskan PR stub kontrak.
- Pantau risiko R-02 (bottleneck PM) dan R-05 (beban Anggota 2).
- Saat menyusun dokumen: pastikan tidak ada kata/instruksi di luar domain
  proyek (jebakan AI, R-10).
```

```
## BATASAN
- Jangan menulis controller/model/migration/view fitur.
- Jangan menyetujui PR tanpa approval sejawat dan test yang lulus.

## PERINTAH TAMBAHAN
/gate <PR>      jalankan checklist gerbang merge untuk PR tertentu
/uat <US-XX>     hasilkan skenario UAT dari acceptance criteria SRS
/status         ringkas status kontrak, PR terbuka, dan risiko minggu ini
/cek-submit     jalankan checklist Anggota1.md §8.5
# ===== AKHIR OVERLAY A1 =====
```

10. Definition of Done Pribadi

- [] Repo proyek terpisah dari repo home; `main` terlindungi; CODEOWNERS berisi username PM
- [] Keempat SRS di-merge ke `main` sebelum G1 (19 Sep)
- [] Tidak ada commit langsung ke `main` dalam riwayat (semua lewat PR)
- [] Setiap PR di-merge ≤ 24 jam setelah approval sejawat
- [] `docs/TRACEABILITY.md` terisi untuk ke-17 US
- [] Laporan UAT mencakup 17 US $\times$ role terkait, tanpa defect kritis/mayor terbuka
- [] Checklist §8.5 lengkap sebelum submit
- [] Minimal 3 commit per minggu (dokumen, test plan, traceability) lewat branch `pm/*`

11. Persiapan Tanya Jawab UTS

Kemungkinan pertanyaan	Poin jawaban
"Kenapa PM tidak ikut coding?"	Pemisahan peran: yang menyetujui merge tidak menilai kodenya sendiri; kapasitas coding tetap 3 programmer penuh
"Bagaimana kalian mencegah kode rusak masuk ke <code>main</code> ?"	Proteksi branch, review sejawat + review Code Owner, checklist gerbang merge, test di MySQL sebelum merge
"Kenapa tidak ada QA khusus?"	Pembuat kode menulis test untuk FR-nya; PM melakukan UAT berbasis acceptance criteria SRS
"Bagaimana memastikan semua anggota berkontribusi?"	Setiap US punya satu pemilik; commit memakai akun masing-masing; terlihat di riwayat PR
"Apa itu SRS dan kenapa per role?"	Dokumen kebutuhan formal; per role agar setiap FR punya satu pemilik dan bisa ditelusuri ke US, kode, dan test
"Kendala terbesar?"	Siapkan 2–3 kendala nyata dari notulen sync (mis. antrian merge, menyepakati skema, konflik branch)

12. Changelog

Versi	Tanggal	Perubahan	Oleh
2.1	2026-09-16	Dokumen dipindah ke folder <code>workflow/</code> (SRS ke <code>workflow/srs/</code>); rujukan path dan versi dokumen terkait diperbarui; versi PDF di <code>workflow_pdf/</code> .	DevFlow
2.0	2026-09-16	Peran diubah dari Tech Lead menjadi Project Manager. Pekerjaan fondasi, auth, dan US-13/14/15 dipindah ke Anggota 4. Tambah tanggung jawab: pemegang tunggal <code>main</code> , K-11/K-14/K-15, SRS induk, papan kerja, checklist gerbang merge, rencana UAT, cek akhir submit, overlay PM (CORE v2.0).	DevFlow
1.2	2026-09-15	Laravel 13 + Fortify; K-13; CORE v1.2.	DevFlow
1.1	2026-09-15	K-12 standar DBMS.	DevFlow

Versi	Tanggal	Perubahan	Oleh
1.0	2026-09-15	Dokumen awal Tech Lead · Identity & Access.	DevFlow
